Etapa de Definición

- Introducción
- Marco de ejecución
- Establecimiento de meta
- Estudio de Alternativas
- Cuantificación de Actividades
- Determinación de objetivos
- Determinación del proceso global



Derechos reservados J.A. Pernett

Marco de EjecuciOn

Insumos:

- Expectativas de solución
- Marco legal
- Indicadores
- Diagnóstico

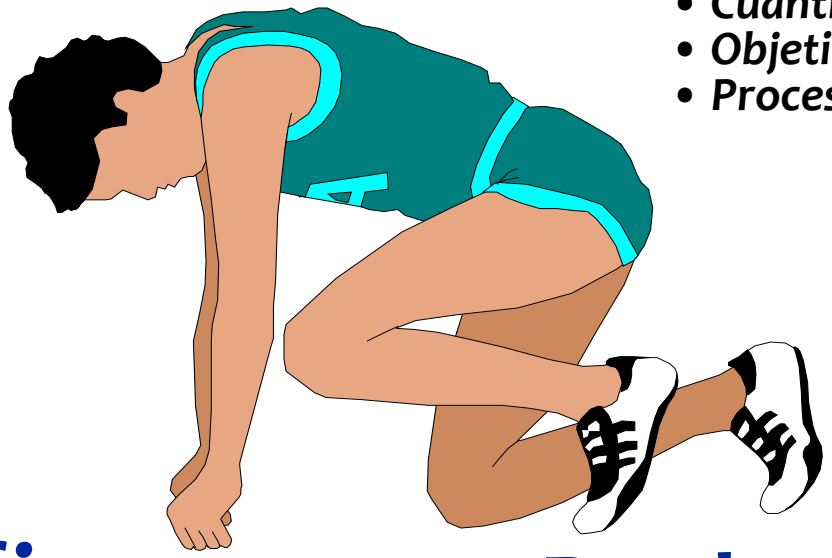

Acciones:

- Metas
- Estudio de alternativas
- Cuantificación de actividades
- Objetivos
- Proceso Global del proyecto

Recursos:

- Básicos (Humanos, Físicos)
- Técnicos (Diagnósticos, Índice Equipos, Software, información)
- Servicio
- Presupuesto

Producto:

- Documento que debe contener los objetivos, metas, estudio de alternativas, marco de ejecución y los insumos y recursos.

Derechos reservados J.A. Pernett

ESTABLECER METAS

- *Cuál es el resultado final deseado?*
- *Cuál es su alcance?*
- *Quienes son los usuarios o clientes del proyecto?*
- *Que esperan estos clientes o usuarios del proyecto?*
- *Que dicen los usuarios sobre lo que se supone se debería estar haciendo?*

Derechos reservados J.A. Pernett

ESTABLECER METAS

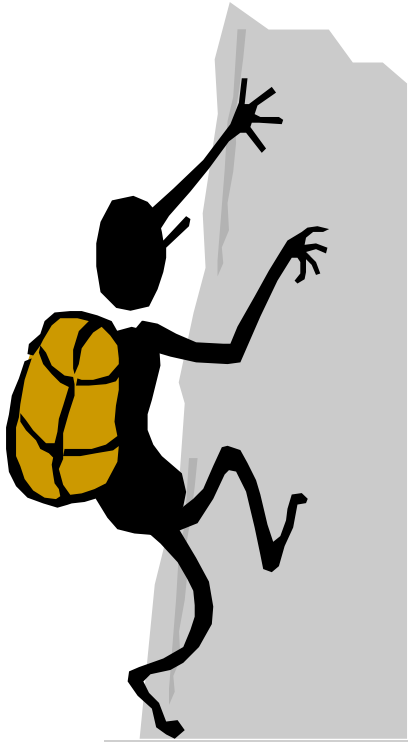

Para que esa meta sea efectiva, debe tener cuatro características que la hagan inteligente, que permita que el proyecto se convierta en el foco de atención y haga que el equipo se comprometa.

- *Específica*
- *Medible*
- *Consensual*
- *Realista*

Derechos reservados J.A. Pernett

Análisis de alternativas

El análisis de alternativas consiste en comparar las diferentes formas de solucionar el problema planteado, estableciendo para cada tipo de solución posible, las metas y las actividades correspondientes

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS	
Reducir los niveles de analfabetismo de la localidad Bosa al 5% de la población. Actualmente el nivel encontrado es del 18%	**ALTERNATIVA 1** Creación del subsidio directo a la alfabetización con cupos para 2500 habitantes
	ALTERNATIVA 2 * Alfabetización de 2000 habitantes mayores de 25 años. * Alfabetización de mujeres trabajadoras

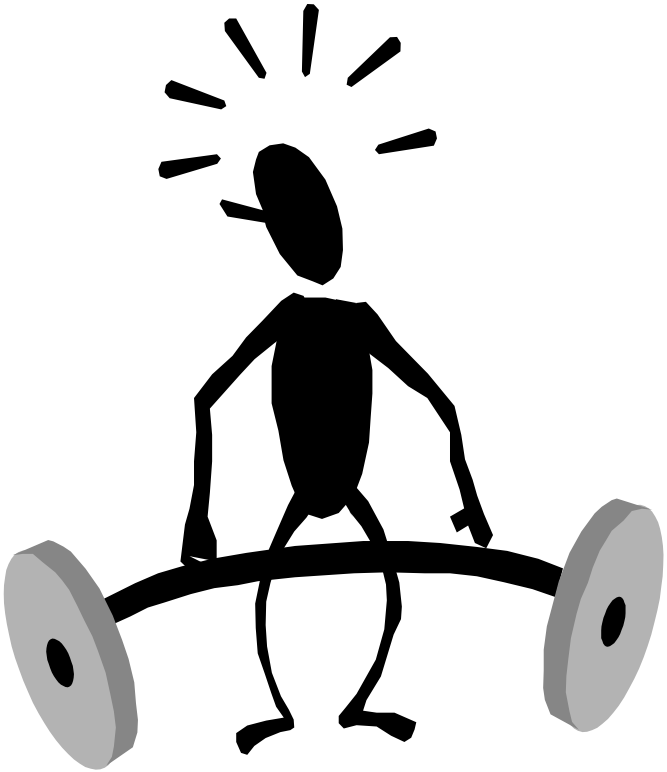

Derechos reservados J.A. Pernett

CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA N° ___					
	RECURSOS E INSUMOS DEL MARCO DE EJECUCION				
ACTIVIDADES	Tiempo	Presupuesto $	Recurso H. horas/hombre	Equipos $	Otros Materiales $
1					
2					
3					
4					
TOTAL:					

Derechos reservados J.A. Pernett

Determinación de los objetivos

OBJETOS DE CONTROL	INDICADOR DE GESTION	RESULTADOS (AÑOS)				ESTANDAR		SIGNIFICADO DEL ESTANDAR
						INTERNO	EXTERNO	

1. Ser importante
2. Ser alcanzable
3. Estar delimitado en el tiempo
4. Ser elemento de comparación
5. Incorporar beneficiarios o grupos objetivos

Derechos reservados J.A. Pernett

DETERMINACION DE PROCESO GLOBAL DEL PROYECTO

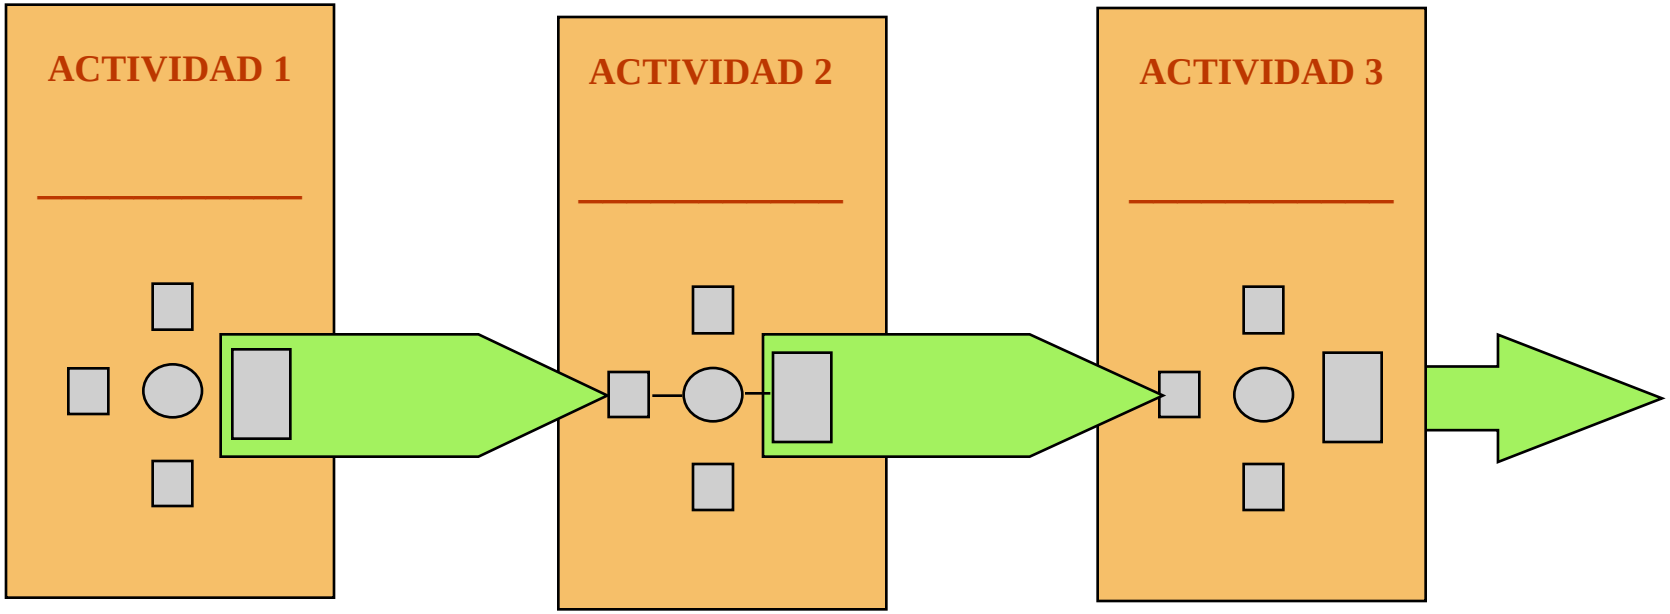

Por proceso global del proyecto se entiende el conjunto de actividades requeridas para obtener los resultados esperados, las cuales se estructuran de una manera lógica y secuencial en el tiempo disponible y acordado para su ejecución. Para cada una de estas actividades se debe realizar su marco de ejecución. Cada una debe estar concatenada con la otra.

Derechos reservados J.A. Pernett

Producto:

El nombre del proyecto debe responder a tres aspectos:

1. ***¿Qué se va a hacer?***

EL PROCESO:. Ejemplo: Ampliación, dotación)

2. ***¿Sobre qué?***

EL OBJETO: Ejemplo Escuela La Concordia

3. ***¿Dónde?***

LOCALIZACION: En la localidad diez

Derechos reservados J.A. Pernett
